

Szupergyors Internet Program Munkacsoport

Időpont: 2020. március 5. (csütörtök)

Helyszín: 1055 Budapest, Szemere utca 6. Díszterem

Tervezett napirend:

1. 13:00-13:10

Előadó: dr. Solymár Károly Balázs, helyettes államtitkár megnyitója,
általános tapasztalatok

2. 13:10-13:25

Előadó: dr. Greinstetter Balázs, helyettes államtitkár
A GINOP 3.4.1 felhívás tapasztalatai az Irányító Hatóság szemével

3. 13:25-13:40

Előadó: Debreceni Győző programvezető (Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség)
SZIP pályázatok (általános összefoglaló az előrehaladásról, jellemző
problémák a végrehajtásban)

4. 13:40-13:55

Előadó: Fónad Tibor, projektvezető (KIFÜ)
Felügyelőmérnöki (FEM) vizsgálatok előrehaladása és tapasztalatai az önerős
és a pályázati fejlesztéseknél

5. 13:55-14:10

Előadó: dr. Kövesi Gabriella, elnök (HÉT)
Iparági tapasztalatok a pályázat és végrehajtás során

6. 14:10-14:25

Előadó: Kéry Ferenc, elnök (MKSZ)
A hírközlési szolgáltatók legfőbb problémái a SZIP lebonyolítása kapcsán

Dr Solymár Károly megnyitó

A SZIP munkacsoportüléseket újra szeretnék indítani. Az idén lejár a határidő és jelenleg a tervezett 501 000 igényhely helyett csak 200 000 igényhely készült el. Nagyon sok helyen még csak a tervezés van folyamatban. Szerencsére a lefedettség ennél jobb, a 2019 lezárult online mapping alapján a 30 Mbps NGA lefedettség 96 % és ezek 80% 100MBps lefedést is lehetővé tesz. A példák alapján a vállalat be lehetett volna fejezni elkészült a UPC-Vodafone vállalat Dabas járásban , a Tarr Kft . Pécsváradi járása és az Eurocable Kft kiépíteni.

Új pályázati felhívás kiírására is sor kerül, még 62000 igényhelyet kell megépíteni 2022 évvégéig. Ez a határidő a végleges, eddig a projekteket le kell zárni. Nehezen megy az adatszolgáltatás, pedig ez nagyon fontos. Egí projekt csak akkor zárható, ha a HTMR adatok is fel vannak töltve.

Áramszolgáltatók tekintetében folyamatos egyeztetés folyt, amelyek hoztak előrelépést.

A projekt mérete áremelkedést hozott magával. A támogatási szerződések (a továbbiakban: TSZ) ki tolásával a szolgáltatók terheit csökkentették.

Debreceni Győző

Négy pályázat ment le az ötödik kiírása folyamatban van. Ez a Ginop 3.4.1. „Kimaradok fejlesztése” címmel hamarosan kiadásra kerül. Jelenleg a minőség biztosítóknál. Főbb jellemzője több mint 60 000 igény pont és kb. 370 km felhordó hálózat építés.

Az eddigi pályázatok megvalósítását elemezték. A legjobb (best effort) a UPC-Vodafone megvalósítása volt: 8 hónap előkészítés 10 hónap tervezés, 10 hónap kivitelezés és zárás. A többenél általános a 28 hónap az előkészítés, és 14 hónapja folyik a tervezés.

A KIFÜ 174 járás, 200 projektet felügyel. Kb 150 járásban van feltöltve Ktk, de van 20 olyan járás ahol meg a fel hordó Ktk sincs feltöltve.

Elindult a 2020 mapping. Az interneten elérhető a Htmr publikus térkép szolgáltatása. publikusterkep.htmr.gov.hu


dr. Greinstetter Balázs irányító bizottság

A pályázatokban nem ritka a négy-öt módosítás, emiatt nehézkessé vált a szerződések kezelése. Minden esetben újra értékelni kell a pályázatot és csak utána lehet a módosítást elfogadni.

A jelenlegi végrehajtási tempó nagyon lassú. Ha a Ginop 3.4.1 is ilyen lesz, problémás lesz a megvalósítás, 2023 elején zárnia kell a projektnek, nincs határidő módosítás.

Fónad Tibor


A FEM 2016 kezdte meg működését. Feladatuk, hogy ellenőrizzék, hogy az építetők azt építik, amit vállaltak. A Fem-ek jelentése alapján jelenlegi helyzet az alábbi ábrán látható:

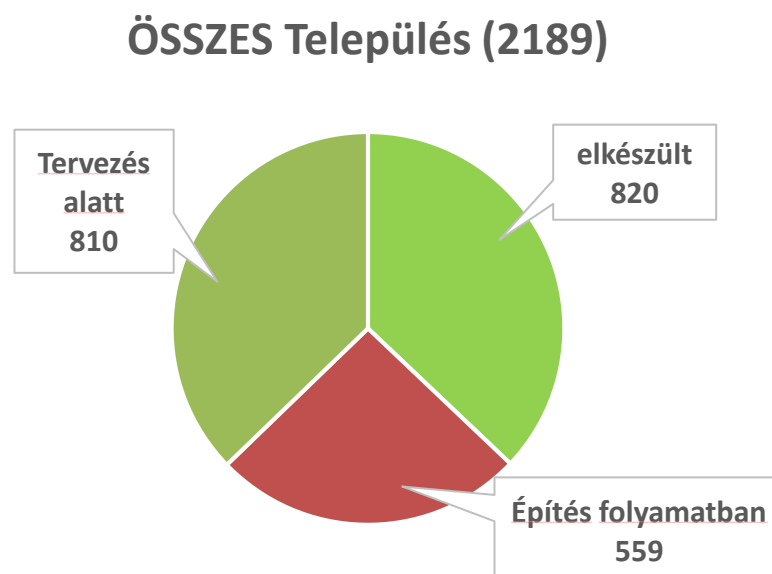

A publikus wi-fi kiépítése csak kb. 20%, míg a közintézmény kb 20% készült el.

A Wi-fi helyét a település vezetőjével kell egyeztetni és erről jegyzőkönyvet kell felvenni.

Műszaki tartalom változtatás 42 % ami nagyon sok. Mapping 11% szinten nagyon sok.

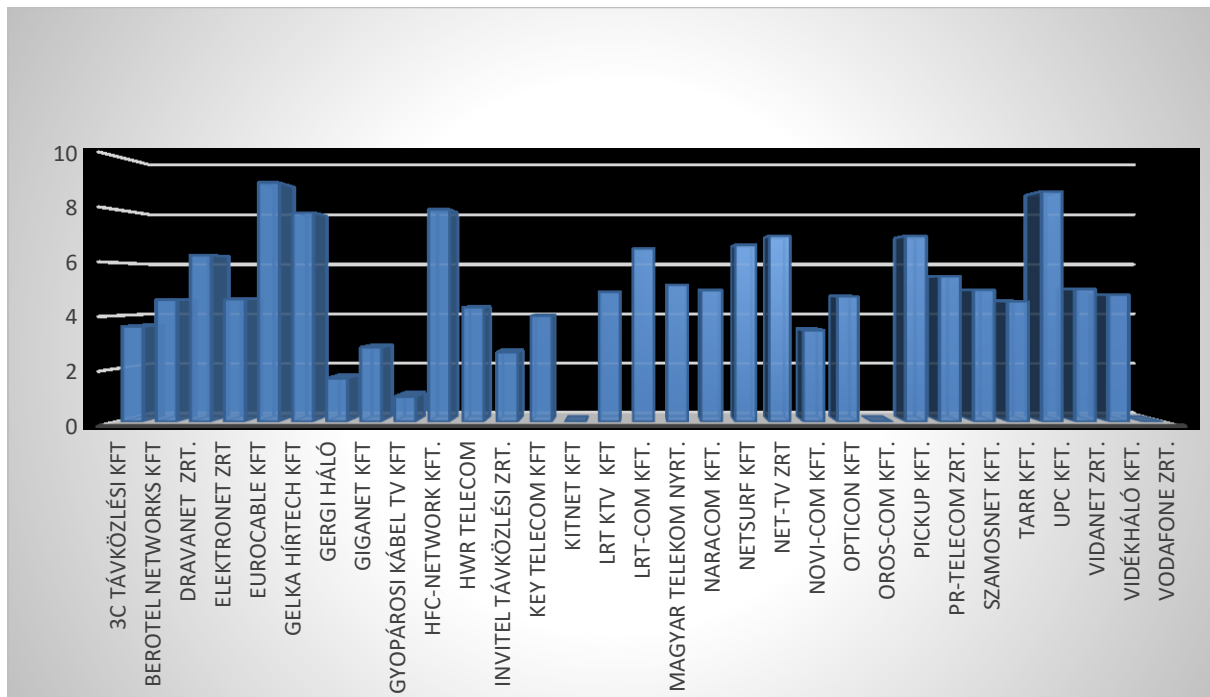

dr. Kövesi Gabriella. HÉT .

A SZIP egy nagyon jó kormányzati kezdeményezés. „Az adatok alapján európai szinten jól állunk vezetékes és mobil hálózattal. A jogi akadálymentesítés segítette a vállalkozásokat.

Több olyan településen indult meg a verseny ,mert másik szolgáltató is épített. Ami nem sikeres. Mi okozza a késedelmet?

2016 novemberben lett aláírva a TSZ., ezért egy nyár elment. Az adminisztráció nehezen megy. PI Tarr Kft egy éve kész van, de csak most tudta befejezni az adminisztrációt és a pénzügyi zárás még vissza van. A kis szolgáltatók nehezen finanszírozzák a megnövekedett költségeket. A TSZ módosítások oka az 2014 alapok alapján készült mapping, azóta sok minden történt.

A körzet hálózatok később épülnek mint a lefedők, ezért addig nem tudja lezárni. A wi-fi előírások később kerültek be a szerződésbe.

Kéry Ferenc MKSz

Legfőbb problémák.

- Koncentrált kereslet a tervezésre, kivitelezésre
- Megdrágult hálózatépítés
- Kapacitás gondok.
- Az áramszolgáltatók szerződések feltételek megváltoztak.
- Kevés a mozgósított tervező (és drága)
- Túlzott áramszolgáltatók feltételek.
- Hozzájárulások hosszú idő MÁV és autópálya.
- Önkormányzati túlkapások elhárítása.
- Versenytársak időhúzó taktikája.

Az előfinanszírozó munka utófinanszírozásra változott.

Kérdések válaszok:

Debreceni Győző

Miért volt 2015 mapping hez kötve. Mert kellett egy kiinduló pont.
Nem lehetett újra kiírni folyamatosan. Az egyik fő problémája a mappingnek az hogy nincs közhiteles lakcím adatbázisunk.

Nagy László Gergi-háló Kft

2015 óta részt vesz a SZIP építésben, van némi tapasztalata.
A kissozolgáltatokat érintik a problémák jelentős része . Például a nógrádi járásoknál 90% beállítás. Ennek a projektnek önfenntartónak kellene lennie. Az előleget nagy késéssel 2019-ben kapták meg, majd 2019 novemberében a szerződést felmondta az IR.
A települések készen vannak, de a fel hordóhálózat hiányzik, amiat nem tudják átadni, de erre már nincs pénz.

Zapletal Zsolt Pick-up Kft

4 járásból 3 szerződését felmondta az IR. 2019 áprilisban küldték olyan szerződést amely 2018 december 31 lejárt. Amit elvettek 3 járást ott is 40% készülség van. ?

dr. Greinstetter Balázs

Egyedi esetben nem tud választ adni. A nagyszámú tsz módosítás be lassítja a folyamatokat.. A műszaki tartalom módosulása nal a KIFU kell fordulni. Az 50% előleg mindenhol kint van, ezért nem érti, ki nem tud finanszírozni. Az előleg fel nem használt részét követeli vissza az ÍR hatóság. A rendelet nem enged mozgásteret. Ha benyújtania egy elszámolást és közben volt tsz módosítás az bonyolítja és megakasztva a kifizetést.

dr. Solymár Károly

Pickup esetét nem itt kell tárgyalni. A szerződéstől elállástól általában tartózkodunk , ha remény lett volna, nem mondjuk fel.. Vizsgáljuk meg. Az információk alapján az volt a helyes.

Debreceni Győző

Gyakori tsz módosítások, műszaki okait meg kell vizsgálni, hogy kell e minden műszaki változtatásnál tsz módosítás is. A htmr fel van készítve a változások kezelésére, de nagyon kevés az eszkaláció.
